

- 30.01.2004 - Isolierung für Wasser in Bosserode bei Firma Horn abgeholt.
- 31.01.2004 - Wasserleitungen im Deckenbereich Isoliert. Baustelle wurde gereinigt.
- 02.02.2004 - Firma Hahner baut in den Sozialräumen die Decken ein. Fa Richter bringt Isolierplatten und den Grundputz an. Fa. Käsmann fugt die Duschen und den Küchenspiegel aus. Seifen und Handtuchspender bei AlSCO in Niedertalhausen geholt. Der Fliesenleger fugt die Duschen fertig.
- 03.02.2004 - Firma Hahner baut weiter die Decken im Sozialbereich und in der Werkstatt ein. Firma Käsmann beginnt in den WC `s die Fußböden zu fliesen. Die Leitungen in den Hausanschlussraum werden durch die Kameraden isoliert.
- 04.02.2004 - Firma Käsmann fliest die Fußböden in den WC `s und in den Duschen fertig. Im Hausanschlussraum wird fertig isoliert.
- 05.02.2004 - Die WC `s und Duschen wurden fertig gefugt. Es wurde begonnen die Tüorzargen zu reinigen und mit Grundierung zu streichen. Bürgermeister Baumann informierte sich vor Ort über den Bauverlauf. Lampen für den Sozialbereich wurden bestellt.
- 06.02.2004 - In den Toiletten wurden die Sanitärgegenstände angebracht. FH- Türen im gesamten Gebäude wurden grundiert.
- 09.02.2004 - Es wurden alle Sanitärgegenstände fertig angebracht und die Heizkörper in den Duschen aufgehängt.
- 10.02.2004 - Es wurden die FH- Türen fertig gestrichen. Die Firma Telekom wollte den Telefon-Anschluss anschließen, es wurde aber keiner angetroffen.
- 11.02.2004 - Termin mit Telekom für den 16.02.04 ausgemacht.
- 16.02.2004 - Lampen für den Sozialbereich wurden angeliefert und es wurde gleich angefangen diese einzubauen. Die Telekom schaltet den Telefonanschluss – leider einen falschen.



Fliesenspiegel in der Küche.



Decke in der Herren- Umkleide



Deckenbau im Flur.



Fußbodenfliesen in den Duschen.



Isolierung an der Halle.

17.02.2004 - Es wurden weiter die Lampen im Sozialbereich eingebaut. Es wurde Eisen für den Regalbau angeliefert. Besprechung mit Herrn Krenz und BGM Baumann.

18.02.2004 - Firma Richter hat den Grundputz außen aufgebracht. Eberhard Zilch hat mit dem Regalbau begonnen.

19.02.2004 - Firma Käsmann hat begonnen die Stiefelwäsche in der Halle zu fliesen. Alarmschaltung verdrahtet.

20.02.2004 - In den Duschen wurden die Decken gestrichen und die Lampen eingebaut. Firma Käsmann flieste die Stiefelwäsche und die Wassersäulen in der Halle fertig.

21.02.2004 - Abluftventilatoren in den Duschen eingebaut.

23.02.2004 - Firma Käsmann ist die letzten Tage auf der Baustelle und fliest die Stiefelwäsche fertig. Steckdosen werden in der Werkstatt angebracht. Eberhard Zilch schneidet Eisen für Regale zu.

24.02.2004 - Eberhard Zilch baut die Untergestelle für die Werkbänke fertig. Schalter und Steckdosen werden bei der Stiefelwäsche angebracht. Es wird an mehreren Stellen nachgestrichen.

25.02.2004 - Besprechung auf der Gemeinde mit Herrn Krenz und Herrn Baumann. Beschriftung der Schalter und Steckdosen. Es werden Armaturen bei der Stiefelwäsche angebracht.

26.02.2004 - Regale und Werkbänke werden weitergebaut. Hermann Funk nimmt die Heizungsanlage ab.
➤ Alles OK!

27.02.2004 - Der Schlüsseltresor wird neu gestrichen. Die Baustelle wurde aufgeräumt.

28.02.2004 - Die Baustelle wurde aufgeräumt und alle nicht benötigten Geräte und Materialien wurden weggebracht. Bürgermeister Baumann besichtigt die Baustelle. Regale wurden weiter gebaut.

29.02.2004 - Der Schlüsseltresor wurde das 2x gestrichen. Die Baustelle wurde gelüftet.



Deckeneinbau im Lager




Isolierung an der Halle.



Gegenstände in Toiletten wurden angebracht.



Stiefelwäsche

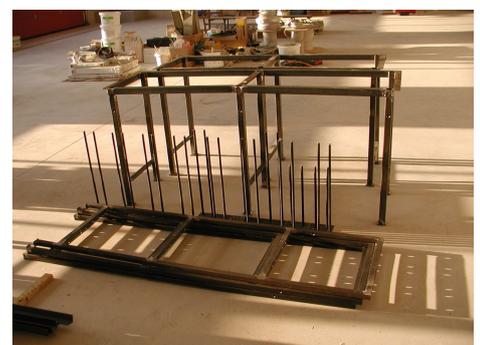

Gestelle für Regale und Werkbank.

- 01.03.2004 - Schlüsselkasten und Stahlschrank für JFW gestrichen. Bewegungsmelder für Alarmanlage in Halle und in Sozialräumen angebracht. Alarmschaltung fertig gebaut.
- 02.03.2004 - Besprechung mit Bürgermeister Baumann Bauamtsleiter Herrn Krenz, Fußbodenleger Herrn Klüber, und Stellv. WF Karsten Rimbach Stahlschrank wurde weiter gestrichen. Eberhard Zilch baute weiter das Schlauchregal.
- 03.03.2004 - Stahlschrank wurde gestrichen. Schlüsseltresor wurde wieder zusammen gebaut. Das Schlauchregal wurde weiter gebaut.
- 04.03.2004 - Besprechung mit Herrn Krenz bezüglich der Außenanlagen. Stahlschrank wurde gestrichen. Schlauchregal wurde weiter gebaut.
- 05.03.2004 - Herr Klüber brachte uns 2 Muster für den Fußboden. Baustelle wurde gereinigt. Schlauchregal weiter gebaut. Stahlschrank gestrichen.
- 06.03.2004 - Stahlschrank gestrichen. Schlüsselkasten aufgehängt.
- 07.03.2004 - Besprechung wegen Fußboden mit den Feuerwehrkameraden.
- 08.03.2004 - Schlauchregal fertig gebaut und für die Verzinkerei vorbereitet.
- 09.03.2004 - Stahlschrank fertig gestrichen. Material sortiert und in Kartons verpackt.
- 10.03.2004 - Stahlschrank zusammen gebaut und in Herren WC zwischen gelagert. Halle aufgeräumt und gereinigt. Herr Klüber brachte 3. Muster auf die Baustelle. > Leider falsch.
- 11.03.2004 - Tore wurden durch die Einbau Firma nachgestellt. Firma Tahlmann holte übriges Material ab.
- 12.03.2004 - Firma Sitzmann baut die Trennwände in die Toiletten ein. > Trennwand in Herren WC defekt.



Schlüsseltresor wurde gestrichen.



Edgar Bardt beim sauber machen.



Gestelle für Regale und Werkbank sind fertig.



Stahlschrank wurde gestrichen.

- 13.03.2004 - Öffentliche Ausschreibung der Außenanlage in der Hersfelder Zeitung.
- 14.03.2004 - Schlauchregal und Werkbankunterteile wurden von der Verzinkerei abgeholt. Firma Richter putzte den Eingangsbereich.
- 15.03.2004 - Firma Richter spachtelte die Außenwände zur Hofseite. Nebenuhren in der Halle aufgehängt und angeschlossen. Anleghalter bei Luke angebracht.
- 16.03.2004 - Besprechung mit Herrn Quanz und Herrn Krenz wegen Restarbeiten am Gebäude und wegen der Außenanlagen. Firma Richter spachtelt die Rückwände der Halle und des Sozialbereiches.
- 17.03.2004 - Firma Richter spachtelt die Außenwände. Schlauchregale und Werkbankgestelle werden durch die Verzinkerei zurück gebracht.
- 18.03.2004 - Firma Richter spachtelte die Außenwände fertig.
- 19.03.2004 - Firma Quanz lieferte die Bohlen für den Spitzboden und baut die Tür im Giebel ein.
- 20.03.2004 - Bohlen auf Spitzboden verlegt und befestigt. Dachverschalung an den Schnittkanten gestrichen.
- 22.03.2004 - Warte schon seit Freitag, 19.3.04 auf einen Anruf vom Fußbodenleger.
- 23.03.2004 - Fußbodenleger meldet sich und will am Mittwoch, 24.03.2004 wegen des Musters kommen. Firma Hahner baut Decke vor Haustür ein.
- 24.03.2004 - Firma Klüber betoniert den Eingangsbereich und baut den Fußabtreter ein. Besprechung mit Herrn Krenz. Firma Sitzmann tauscht defekte Trennwand aus. Ecken zwischen Wand und Decken nochmals nach gestrichen. Musterleuchte für außen bei Firma Schmitt abgeholt. Fußbodenmuster soll bis zum Fr., 26.03.04 vorliegen.



Trennwände in den WC's wurden eingebaut.



Gestelle für Regale und Werkbank.



Gestelle für Regale und Werkbank.



Tür in Giebel wurde eingebaut.



Fußabtreter vor Haustür eingesetzt.

25.03.2004 - Bei Firma Ziegler angerufen und die Spinde für die 17 / 18 KW vorbestellt. Ich habe 8 x 3er Spinde und 6x 2er Spinde bestellt. Mit Bürgermeister Baumann Farben für Außenputz abgesprochen.

- Wände = Altweiß
- Sockel = dunkelgrau
- Lampen laut Muster bestellt.

Übergänge fertig gestrichen und Gerüst zu Reinhold Kersch gebracht.



Der Boden wurde Sandgestrahlt.

26.03.2004 - Firma Klüber wegen Fußboden angerufen. Wollte sich melden, hat er aber nicht. Material bei Sauerwein & Dilcher eingekauft.



Vorbereitungen für den Belag.

27.03.2004 - Verdrahtung der Außenbeleuchtung im Eingangsbereich Löcher für Strahler in Decke gebohrt.

29.03.2004 - Besprechung mit Herrn Richter bezüglich des Außenputzes. Farbe und Beginn der Putzarbeiten.



Die Beschichtung wurde aufgestreut.

30.03.2004 - Herr Klüber brachte 2 Muster für Fußboden. Beide sehen sehr gut aus.

31.03.2004 - Fußboden laut Muster wurde bei Firma Klüber bestellt. Muster Nr. 2

02.04.2004 - Firma Homann verkleidet die Tür im Giebel mit Blechen. (Anschläge)

05.04.2004 - Firma Richter kam nicht zum Putzauftragen an den Außenwänden, weil es regnete.



Der fertige Belag in eine Umkleide.

06.04.2004 - Die Firma FSB beginnt den Boden im gesamten Gebäude sandzustrahlen. Der Sockel wird im ganzen Gebäude angebracht.

07.04.2004 - Der Sockel ist im gesamten Gebäude wieder abgefallen. Der Sockel wird neu angebracht und im gesamten Gebäude wird die Beschichtung aufgestreut.

08.04.2004 - Der Belag und der Sockel werden beschichtet.

09.04.2004 - „Karfreitag“ Die Räume die nicht so rau sein sollten werden das 2. versiegelt.



Der fertige Belag in der Halle .

10.04.2004 - Nach dem Aushärten waren die Böden fertig.

- 13.04.2004 - Es werden die Heizkörper, Lichtschalter und Steckdosen ausgebaut. Am Nachmittag ist Besprechung mit dem Fußbodenleger und Herrn Krenz bezüglich der Beläge in Halle und Sozialbereich. Die Beläge sind nicht zufrieden stellend bearbeitet.
- Die Beläge sollen neu geschliffen und versiegelt werden.



Der Außenputz wurde aufgebracht.

- 14.04.2004 - Die Firma FSB hat den kompletten Boden überarbeitet und neu versiegelt. Die Firma Richter beginnt den Außenputz aufzutragen.



Der Putz wurde auch noch gestrichen.

- 15.04.2004 - Um 7:00 Uhr wurde mit Herrn Krenz und dem Chef der Firma FSB Herrn Leibhold der Fußboden abgenommen.
- Farbunterschied im Büro und
 - Unebenheiten am Rand im Flur
- Bürgermeister soll weiters in der nächsten Woche entscheiden, da er im Urlaub ist. Lampen für außen wurden durch die Firma Schmidt geliefert.



Einen Blick auf die Baustelle im April 2004.

- 16.04.2004 - Die Firma Richter stellte die Arbeiten am Außenputz fertig.

- 17.04.2004 - Anbringen und anschließen aller Außenlampen. Die Jagdgenossen stellten uns ihren Hubsteiger zur Verfügung.

- 19.04.2004 - Besprechung mit Firma Quanz und Firma Herrmann bezüglich der Außenanlagen. Es werden alle Schränke und Küchenteile aus der Scheune in die Halle gebracht.



Die Strahler werden angebracht.

- 20.04.2004 - Durch die Firma Holz Jung werden die Bretter für die Regale angeliefert.

- 21.04.2004 - Begehung mit Bürgermeister Baumann wegen Abnahme des Fußbodens.
- Flur und Lager = Neu
 - Halle = Nachlass
 - Umkleiden, Küche, Werkstatt = OK !
- Es wird begonnen die Bretter für die Regale zu streichen.

- 22.04.2004 - Bretter für Regale werden gestrichen.

- 23.04.2004 - Bretter für Regale werden gestrichen.



Beleuchtung vor der Halle bei Nacht.

24.04.2004 - Bretter für Regale gestrichen. Das ganze Gebäude wird aufgeputzt.

26.04.2004 - Die Firma Quanz beginnt mit dem Setzen der Randsteine um das Gebäude. Es wird begonnen die Regale in Werkstatt und Halle aufzubauen.

27.04.2004 - Es werden weitere Randsteine durch die Firma Quanz gesetzt. Das Schlauchregal wird fertig aufgebaut.

28.04.2004 - Die Firma Quanz setzt Randsteine und die Firma Hermann richtet die Baustelle ein. Baubesprechung mit Herrn Krenz, Herrn Quanz, Herrn Klüber, Herrn Leibold und WF Miltenberger wegen Beanstandungen am Fußboden.

29.04.2004 - Die Firma FSB beginnt den Fußboden im Lager und im Flur neu zu überarbeiten. Arbeitsplatten für Werkbänke werden gestrichen. Firma Richte setzt Randsteine um den Gastank. Die Firma Herrmann beginnt den Parkplatz links neben dem Haus zu ebnen. Probleme treten auf:

- der Unterbau ist nicht fest, es muss mehr Kalkschotter eingebaut werden als in der Ausschreibung festgelegt wurden

30.04.2004 - Firma FSB versiegelt die Fußböden im Flur und Lager. Die Firma Quanz pflastert den Bereich um den Gastank. Besprechung durch Herrn Krenz und Vorarbeiter der Firma Herrmann wegen den Arbeiten am Parkplatz. Der Wendehammer wird abgerissen.

03.05.2004 - Firma Herrmann beginnt mit der Einebnung der Hofffläche und legt die Höhen fest. Die Firma Quanz setzt die Randsteine.

04.05.2004 - Besprechung mit Bürgermeister Baumann, Wehrführer U. Miltenberger und Bauamtsleiter Herrn Krenz bezüglich des Fußbodens in der Halle. Firma Hott wird informiert, dass sie den Innenputz anbringen kann.

05.05.2004 - Die Firma Quanz hat beginnt die Parkplatz-Fläche auszubaggern. Firma Hermann füllte um das Gebäude Mutterboden an.



Bretter für die Regale werden gestrichen.



Eberhard und Björn bauen ein Regal auf.



Das Schlauchregal wird aufgebaut.



Einfassung des Gastanks.



Este Arbeiten am Parkplatz- Unterbau.

06.05.2004 - Die Firma Hott beginnt den Innenputz anzubringen. Firma Quanz setzt die Randsteine für den Waschplatz. Es beginnt sehr stark zu regnen. Firma Herrmann stellt die arbeiten ein.



Die arbeiten am Hof gehen gut vorran.

07.05.2004 - Die Firma Hott bringt in den letzten Räumen den Innenputz auf. Firma Quanz setzt die letzten Randsteine für den Parkplatz. Firma Herrmann arbeitet gar nicht. Es regnet sehr stark. Es werden Schalter und Steckdosen im Sozialbereich eingebaut und die Schränke für das Büro gereinigt und aufgestellt.



Der Innenputz wurde schon angebracht.

08.05.2004 - Es werden die Unterschränke für die Küche gereinigt und aufgestellt. Der PC im Büro wurde in Gang gebracht. Schalter und Steckdosen im Sozialbereich werden fertig eingebaut. Die Firma Horn liefert die Elektrogeräte für die Küche.

- Kühlschrank
- Herd
- Abzugshaube

10.05.2004 - Aus dem alten Gerätehaus werden schon Kartons aus dem WF- Büro in das neue Gerätehaus gebracht und eingeräumt. Die Firma Herrmann beginnt mit dem Pflastern der Parkplatzfläche vor dem Sozialbereich.



Es geht mit schwerem Gerät ans Werk.

11.05.2004 - Es wird begonnen, den Waschplatz zu pflastern. Die Schalter und Steckdosen im Sozialbereich beschriftet.

12.05.2004 - Besprechung mit BGM Baumann wegen der Außenreklame am Gebäude. Es wird die gesamte Pflasterfläche eingeebnet. Die Hängeschränke für die Küche werden gereinigt.



Die Randsteine wurden gesetzt.

13.05.2004 - Pflastern der Hoffläche wird begonnen. Es werden weitere Dinge aus dem alten FwGh in das neue geräumt.

14.05.2004 - Unterbau für den Parkplatz wird ausgebaggert und es wird neuer Schotter eingebracht. Das Büro wird weiter eingeräumt.



Einläufe wurden gesetzt.

15.05.2004 - Die Duschtrennwände werden mit Silikon abgedichtet.

- 17.05.2004 - Die Hoffläche wird zum Pflastern vorbereitet.
- 18.05.2004 - Das vorhandene Pflaster wird vor den Hellen verlegt.
- 19.05.2004 - Das Pflaster konnte nicht weiter verlegt werden, da es nicht angeliefert wurde. Der gesamte Sozialbereich wird durch die Frauen einer Grundreinigung unterzogen. Es werden Gardinen in der Küche und im Büro aufgehängt. Der Kompressor angeschlossen.
- Kompressor wurde von Ch. Kersch
 - Gardinen wurden von I. Miltenberger gespendet



Um den Gastank wurde auch gepflastert.

- 21.05.2004 - In der Küche werden die Hängeschränke angebracht.



Die Arbeiten am Hof gehen weiter.

- 22.05.2004 - **Auf den Tag genau ist 1. Jahr Bauzeit vergangen.** E. Zilch bringt die Bleche am Schlauchregal in der unteren Ablage an.



Der Mutterboden wird angefüllt.

- 24.05.2004 - Die Firma Herrmann verlegt das Pflaster auf dem Hof fertig. Einlauf in der Parkplatzfläche gesetzt.

- 25.05.2004 - Pflastersteine für Hoffläche geschnitten und Grus eingekehrt. Bei der Parkplatzfläche wird der Unterbau hergestellt.

- 26.05.2004 - Hoffläche wird abgerüttelt und Grus eingekehrt. Mutterboden für Grünfläche zum Fichtenweg wird eingeebnet.



Werkbänke wurden aufgebaut.

- 27.05.2004 - Mutterboden für Grünfläche zur B27 wird eingeebnet. Parkplatzfläche geebnet. Die fehlenden Zimmertüren werden durch die Fa. Apel eingebaut. Fa. Hartwig stiftete einen PC der im Büro eingesetzt wird.

- 28.05.2004 - Außenanlage wird durch die Firma Herrmann fertig gestellt. Halle wird gekehrt.

- 29.05.2004 - Hoffläche wird gewässert und die Halle wird nass gereinigt.



Der Hof ist fast fertig.

- 01.06.2004 - Alle Räume werden gereinigt und für den Einzug vorbereitet.
- 02.06.2004 - Spinde für die Umkleiden werden durch eine Spedition geliefert. Ab 17:00 Uhr wird das alte FWGH geräumt und es wird in das neue FWGH eingezogen.
- 03.06.2004 - Es werden Regale und Kisten eingeräumt.
- 04.06. –
09.07.04 - Es werden Kisten, Regale, Schränke eingeräumt und es wird begonnen, die Küche aufzubauen.
- 14.07.2004 - Die Küche wird fertig aufgebaut und es werden die Elektrogeräte angeschlossen.
- 17.07.2004 - Es werden die Wasseranschlüsse in der Küche hergestellt.
- 19.07.2004 - Altes Feuerwehr- Symbol und Schaukasten aus der Lackiererei Ebert in Bebra werden geholt.
- 12.08.2004 - Feuerwehr- Symbol und Schaukasten am FWGH werden angebracht.
- 23.08.2004 - Tische und Stühle werden durch die Firma Gerd Höhn angeliefert und aufgestellt.
- 01.08. –
30.09.2004 - Im August und September werden viele kleine Arbeiten durch die Kameraden geleistet.
- 06.09.2004 - Es wird zwischen der Halle 1 und Halle 2 das Piktogramm (retten- löschen- bergenschützen) durch die Firma Bieber Neon angebracht. Der Schriftzug an Giebelseite zur B 27 wird wegen Fehlern nicht angebracht.
- 10.09.2004 - Der Schriftzug wird an der Giebelseite zur B 27 angebracht.
- 15.09.2004 - Es wird Geschirr in der Metro für 54 Personen gekauft.
- 16.09.2004 - Das Geschirr wird gereinigt und im FWGH eingeräumt.



Das erste Fahrzeug wird in die Halle gefahren !



Einen Blick in die Umkleiden.



Ein letztes Bild am alten FWGH.



Fahrzeuge in der neuen Halle.



Altes Feuerwehr- Symbol nach der Überarbeitung.
